



Příloha ZD05 – Závazný harmonogram realizace díla DMVS


K č. j. ČÚZK-10685/2020

Termíny, které je Účastník ZŘ povinen plně akceptovat a uvést ve smlouvě (milníky), jsou:

Hlavní milníky projektu IS DMVS	Zahájení	Termín předání plnění	Akceptace – fakturační etapa	% ceny plnění
Detailní analýza a návrh řešení (požadavky pro dodávku DMVS I.)	Dnem účinnosti smlouvy	17. 3. 2021	31. 3. 2021	10 %
Detailní analýza a návrh řešení (požadavky pro dodávky DMVS II., III., IV.)	1. 4. 2021	16. 7. 2021	30. 7. 2021	10 %
Dodávka DMVS I.	1. 4. 2021	12. 8. 2021	30. 9. 2021	15 %
Dodávka DMVS II.	1. 10. 2021	10. 3. 2022	29. 4. 2022	20%
Dodávka DMVS III.	1. 5. 2022	11. 11. 2022	30. 12. 2022	20 %
Dodávka DMVS IV.	1. 1. 2023	9. 3. 2023	28. 4. 2023	20 %
Finální akceptace a předání IS DMVS do rutinního provozu	1. 5. 2023	29. 4. 2023	30. 6. 2023	5 %

V případě, že by k podpisu smlouvy mělo dojít po 31. 1. 2021, dojde ještě před podpisem smlouvy ke zkrácení harmonogramu plnění tak, aby byly zachovány poměrově délky jednotlivých výše uvedených aktivit a zároveň došlo k ukončení akceptačního řízení aktivitu „Finální akceptace a předání IS DMVS do rutinního provozu“ nejpozději k 30. 6. 2023 (termín vyplývající ze spolufinancování projektu z fondů EU).

Výše uvedené hlavní milníky jsou zároveň fakturačními etapami (za předpokladu splnění akceptačních podmínek). Zadavatel níže uvádí svůj předpoklad plnění dílčích plnění v rámci hlavních milníků. Funkční požadavky dílčích plnění odpovídají Příloze ZD02.

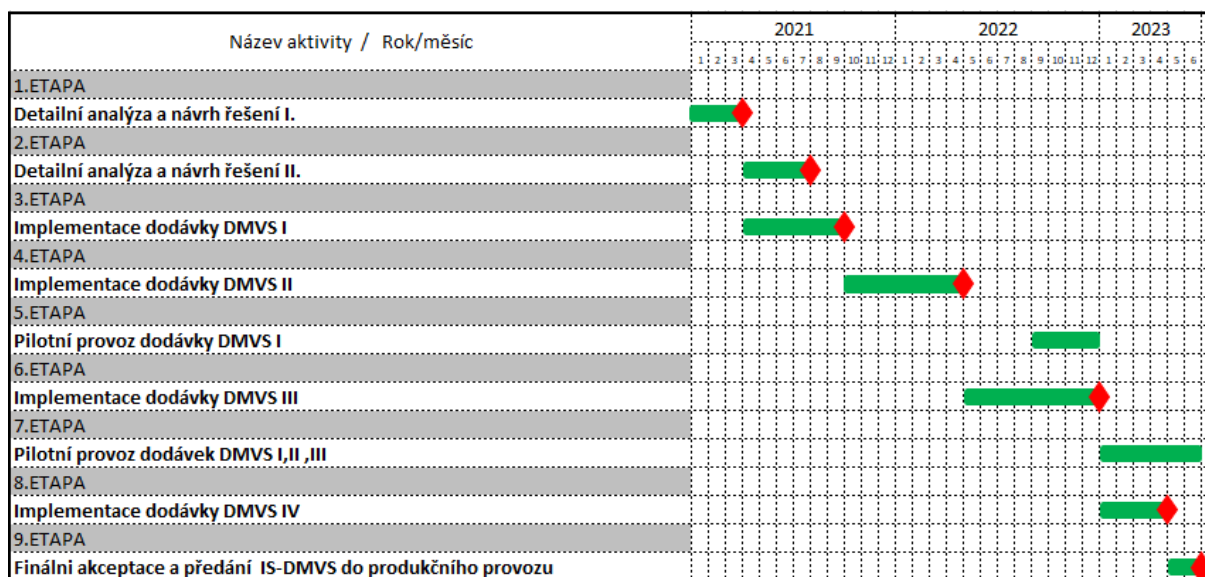

Strana 3/3
